




Status på fjernvarmeprojekter

FD Hvidovre/EBO Consult A/S

25. april 2022

Renovering af Arnold Nielsens Boulevard

- Kappen på de nye rør er så store, at anlægsarbejderne vil spærre den ene kørebane.
- Forsyning til Grækerkvarteret.
- Der vil være begrænset/ besværlig adgang til de enkelte matrikler.
- De eksisterende rør ligger af ukendt årsag meget dybt.
- Flytte hovedtracé fra Arnold Nielsens Boulevard til alternativ placering langs Sognegårds Alle
- Udbudsmateriale udarbejdes i maj/ juni 2022

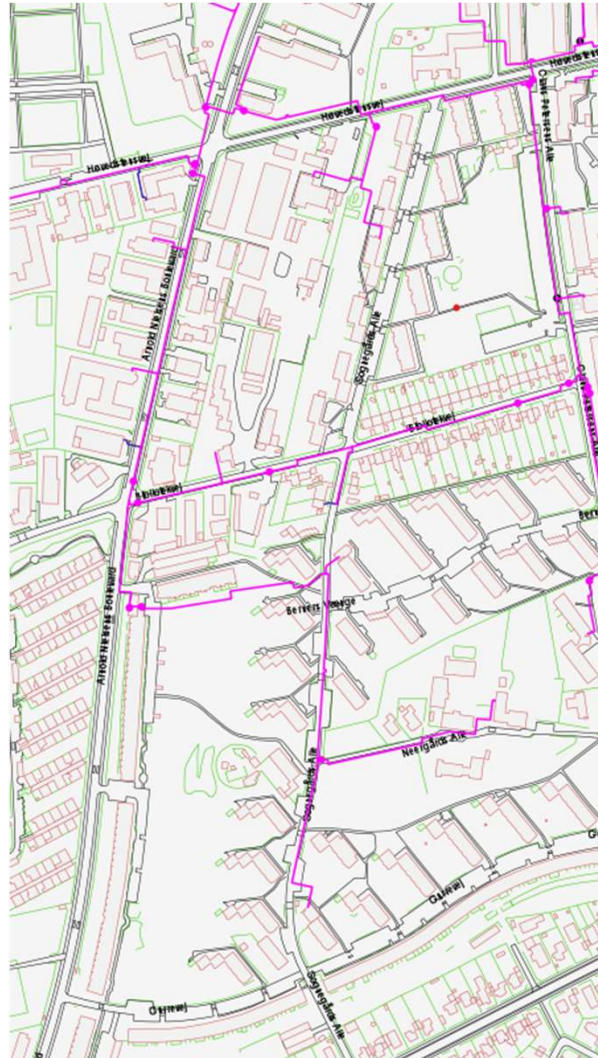

Terrassehusene

- Der har været afholdt infomøde i forbindelse med generalforsamlingen.
- Arbejderne er opstartet den 19. april
- Byggeplads er etableret

					opgaver
Etape 1					
Gravearbejde - stik	6	3 dage	ti 19-04-22	to 21-04-22	
Tilfyldning - reetablering stik		3 dage	ma 02-05-22	on 04-05-22	11
Gravearbejde - hovedledning	90	9 dage	to 05-05-22	on 18-05-22	3
Rørarbejde		2 dage	fr 22-04-22	ma 25-04-22	2
Rørarbejde - hovedledn.		7 dage	to 19-05-22	ti 31-05-22	4
Tilfyldning - hovedledning		6 dage	on 01-06-22	to 09-06-22	4;6
Asfalt		1 dag	fr 10-06-22	fr 10-06-22	7
Etape 2					
Gravearbejde - stik	9	5 dage	ma 25-04-22	fr 29-04-22	2
Tilfyldning - reetablering stik		5 dage	to 05-05-22	on 11-05-22	3
Gravearbejde - hovedledning	65	9 dage	to 19-05-22	to 02-06-22	4
Rørarbejde		3 dage	ma 02-05-22	on 04-05-22	11
Rørarbejde - hovedledn.		5 dage	fr 03-06-22	fr 10-06-22	13
Tilfyldning - hovedledning		5 dage	ma 13-06-22	fr 17-06-22	13;15
Asfalt		1 dag	ma 20-06-22	ma 20-06-22	16
VVS arbejder 1+2		6 dage	ti 21-06-22	ti 28-06-22	17
SOMMERFERIE 2022					
		25 dage	ma 04-07-22	fr 05-08-22	
Etape 3					
Gravearbejde - stik	11	6 dage	ma 08-08-22	ma 15-08-22	
Tilfyldning - reetablering stik		6 dage	ma 22-08-22	ma 29-08-22	32
Gravearbejde - hovedledning	70	10 dage	ma 22-08-22	fr 02-09-22	32
Rørarbejde		3 dage	ti 16-08-22	to 18-08-22	23
Rørarbejde - hovedledn.		5 dage	ma 05-09-22	fr 09-09-22	25
Tilfyldning - hovedledning		6 dage	ma 12-09-22	ma 19-09-22	27
Asfalt		1 dag	ti 20-09-22	ti 20-09-22	28
Etape 4					
Gravearbejde - stik	6	4 dage	ti 16-08-22	fr 19-08-22	23
Tilfyldning - reetablering stik		4 dage	ti 30-08-22	fr 02-09-22	24
Gravearbejde - hovedledning	65	8 dage	ma 05-09-22	on 14-09-22	25
Rørarbejde		5 dage	fr 19-08-22	to 25-08-22	26
Rørarbejde - hovedledn.		5 dage	to 15-09-22	on 21-09-22	34
Tilfyldning - hovedledning		5 dage	to 22-09-22	on 28-09-22	36
Asfalt		1 dag	to 29-09-22	to 29-09-22	37
VVS arbejder 3+4		6 dage	fr 30-09-22	fr 07-10-22	38

Ny tilslutninger

- Der er kommet 329 nye via pakkeløsningsprojekt
- Der er kommet 125 flyverstik
- De planlagte arbejder forventes afsluttet i løbet af sommeren 2023

