



Status på fjernvarmedriften - nye aktiviteter

Avedøre Fjernvarme v/EBO Consult A/S

26. September 2022



Nye driftsaktiviteter – 2. halvår 2022

April 2022

-

Maj 2022

- Syn af boilerrum syd og nord

Juni 2022

- Nedlæggelse af Dantæt systemet

Juli 2022

- Reparation af skorsten på centralen

August 2022

September 2022

Aftapningsrør: Øens VVS NY ☐
 Kontaktperson: Peter Tlf.: 6098-3222 EKS ☒
 Anvender: Køb Dato: 16-5-2022
 Aftap Type: SPLIT Nr.: _____

Aftapning.
 Der etableres aftapningsmuligheder, så alt trykprøvevand (vandværksvand) kan aftappes, før
 fyldning af fjernvarmevand. Skal forberedes for plombering

Varmvandsbeholder (ref. 2.4.4). Volumen 4500 l Reci

Manometre (ref. bilag A) skal monteres

Termometre (ref. bilag A) skal monteres

Snavssamler (ref. bilag A) skal monteres

Ventiler.

Der etableres aftapningsventiler umiddelbart efter snavssamler, samt aftp.


Fjernvarmemåler.

Afspæringsventil umiddelbart efter måler


230 V VVS-installatøren skal sørge for at etablere stik med nøgleafbryder.

_____ MWh Strømsforbrug Aftapningsform Radio

Sikkerhedsventil til afløb, afsluttet min. 5 cm. over

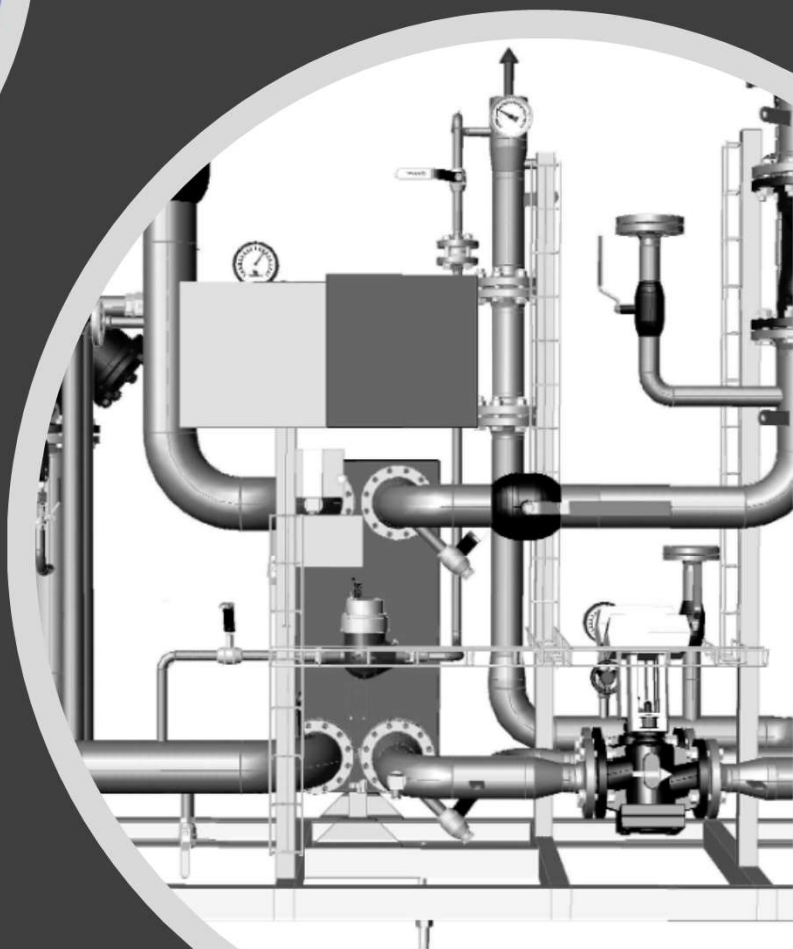

Nye boilerum i syd og
 nord. Synes og igangsættes

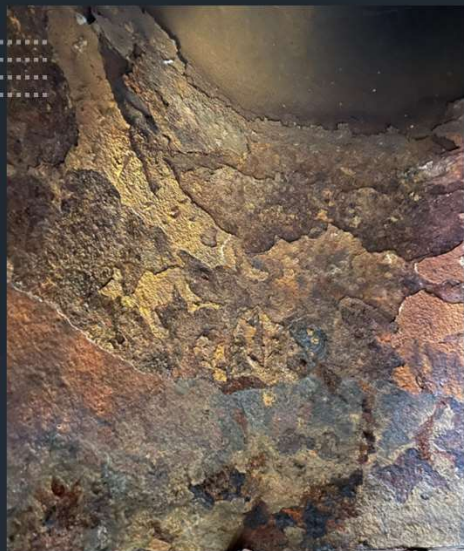

Skorstens- reparation

Noter/fremtidige fokusområder:

- Planlagte strømafbrydelser
- Udbygning af trykholderanlægget så det kan ses fra CTS
