




Status på fjernvarmedriften - nye aktiviteter

Avedøre Fjernvarme v/EBO Consult A/S

14. november 2022

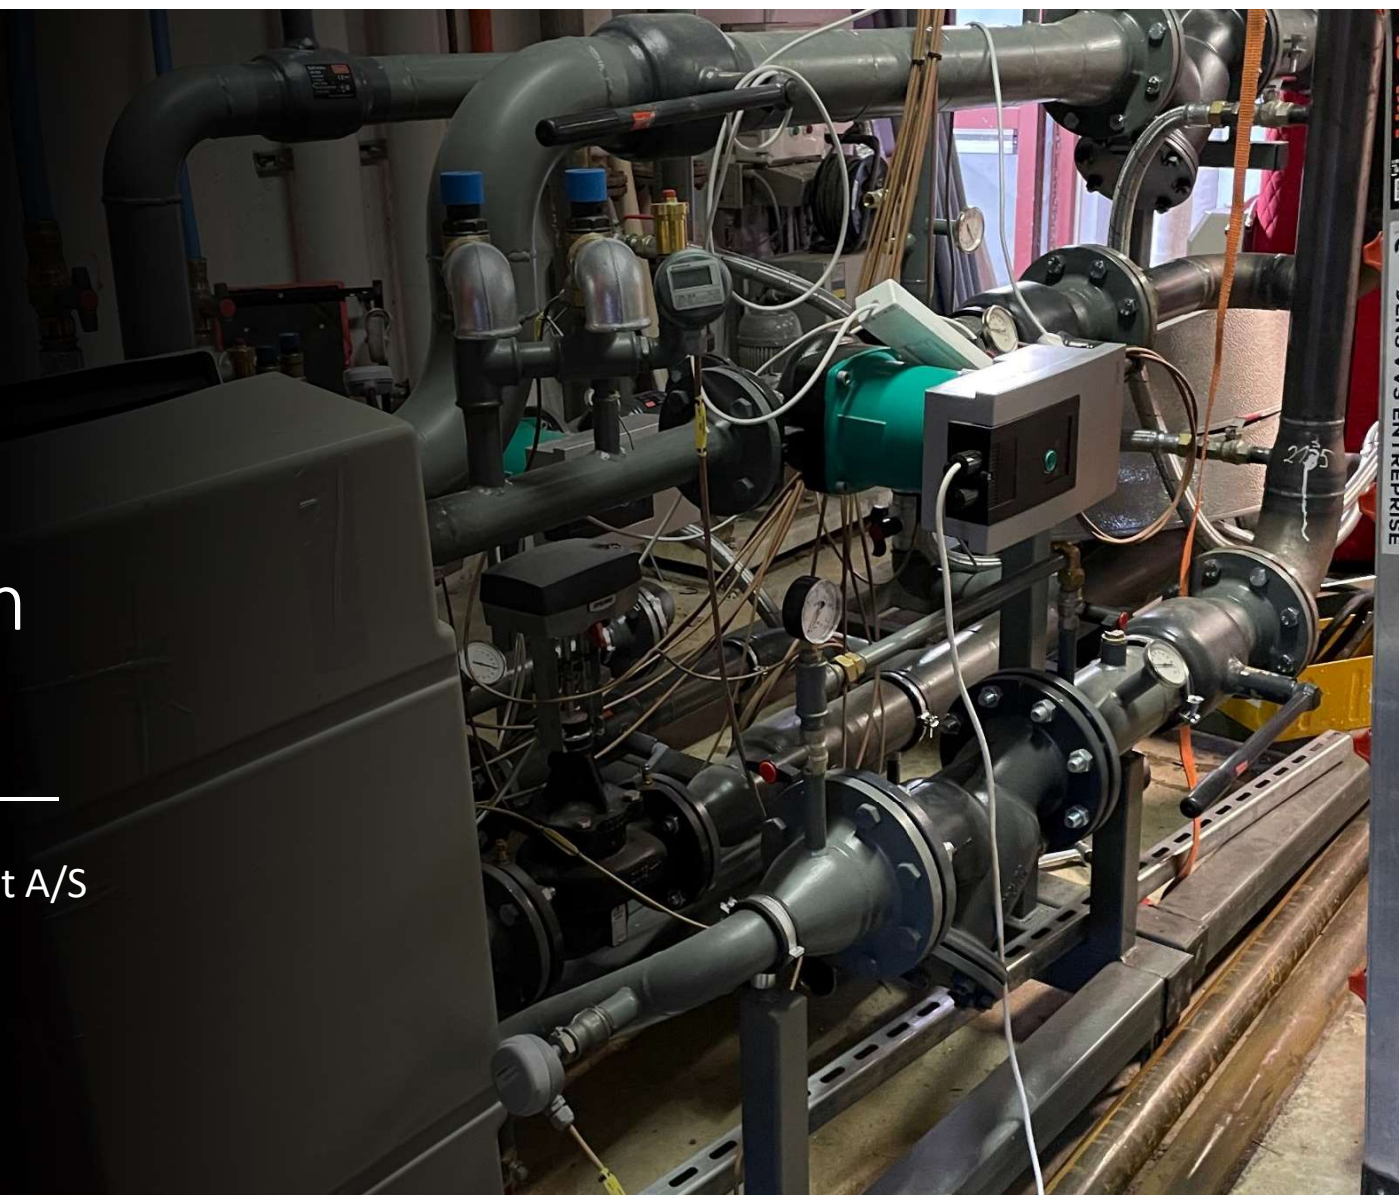

Nye driftsaktiviteter – 2. halvår 2022

September 2022

- Udfordringer med renoveringen i Nord

Oktober 2022

- Syn af sidste boilerrum i syd
- Lækage fra ikke synede installationer i Nord, Bymuren 32

November 2022

- Brønde ventiler efterses og motioneres i alle områder
- Reform af afskrivninger i centralen

December 2022

Januar 2023

Februar 2023



Nye boilerum i
afdeling syd synet
“med veksler”

Lækage i Nord

- Lækage efter nye rør er taget i brug

plastmateriale



Centralen

- Afskrivnings ark gøres digitale



Avedøre Stationsby		
PH - Værdi	Alarmer rettes til	
Overløb, fra tank, trykholder anlæg	Max. alarm pr time eller dag, denne skal kigges efter om der er alarm på så den ikke kommer til at stå og løbe uden at tanken er overfyldt og hvis der ikke kommer alarm fra trykholderanlægget, der er her tale om den alarm der kommer fra max påfyldning af tank.	
Delstrømsfilter, mål,er for denne	Skiftes ud med digital måler og lægges ind med alarmer for flow m.m. det eksisterende vandur udskiftes.	
El måler(hovedmåler for centralen)	For at for bedre overblik og for evt fremtidig besparelser, den der sidder transformer stationen, tallet skal kunne aflæses på en måde så det kan give overblik over en given periode, udtræk m.m.	
(hoved gasmåler)	Ligesom olie tank beholdning er denne værdi også vigtigt at kunne aflæse nemt, hvis det lader sig gøre	Denne værdi lægges ikke ind i CTS men blot i dirft raporten, da det vil blive for bøvlet og dyrt at trække den over måleren fra HMN
Kedel forbrug måler	Ved kedelkørsel kan produktionen ses her og talene kan bruges ved andre sammenhæng	Værdierne hentes fra VEKS og der skal blot tegnes billede i IGGS
Proces varme for kedel 2 og 3	Alamer for manglende flow kan lægges over temperaturer og flow, der skal sættes bus i måler.	Laves om til at kunne se m3, tallet skal kunne aflæses på en måde så det giver overblik over en given periode Faceplate
Der er 5 opjektkter der skal lægges ind i IGGS x med 25.000.-		

Udbygning af CTS systemet

- Forundersøgelse foretaget med henblik på bedre monitorering af objekter på centralen
